114 年丹娜絲颱風
重大土砂災害事件紀實

農業部農村發展及水土保持署
中華民國114年7月

第一章　災情概況

1.1 事件概述

中央氣象署於民國 114 年 7 月 5 日 08 時 30 分發布丹娜絲颱風海上颱風警報，並於 7 月 5 日 20 時 30 分發布陸上警報，根據中央氣象署資料，7 月 5 日 02 時於臺灣西南西方海面生成後向北北東移動，朝臺灣海峽南部接近，對南部及東南部構成威脅。7 月 6 日 23 時 40 分颱風中心登陸嘉義縣布袋鎮，7 日 06 時於桃園新竹交界出海。7 日 11 時 30 分颱風持續往北北東移動，北部陸地脫離暴風圈，解除陸上颱風警報；同日 17 時 30 分臺灣北部海域脫離暴風圈，解除海上颱風警報(表 1-1、表 1-2 及圖 1-1)。

農村水保署因應本次颱風事件，於 7 月 5 日 08 時 30 分開設土石流災害應變小組，於 7 月 12 日 15 時 25 分解除。本次事件期間，發布土石流紅色警戒，共計 143 條分布 4 縣市 15 鄉鎮 56 村里；土石流黃色警戒，共計 226 條分布 8 縣市 20 鄉鎮 90 村里，至 11 日 12 時 30 分(第 23 報)解除全部土石流黃色警戒。大規模崩塌警戒發布：大規模崩塌紅色警戒者共 9 處，座落於 3 縣市、6 鄉鎮、8 村里，大規模崩塌黃色警戒者共 6 處，座落於 1 縣市、4 鄉鎮、5 村里。。本次災害期間發布土石流警戒紀錄如表 1-3 所示。

表 1-1 114 年丹娜絲颱風累積雨量排序

序次	站名	位置	累積雨量(mm)
1	大漢山	屏東縣春日鄉	1453
2	山豬窟	臺東縣大武鄉	1283
3	多納林道	高雄市茂林區	1112.5
4	上德文	屏東縣三地門鄉	1096.5
5	瑪家	屏東縣瑪家鄉	1064
6	達仁林場	臺東縣達仁鄉	1058.5
7	壽卡	臺東縣達仁鄉	1048
8	阿禮	屏東縣霧臺鄉	1045.5
9	尾寮山	屏東縣三地門鄉	1029
10	南田	臺東縣達仁鄉	1022.5

表 1-2 114 年丹娜絲颱風警報發布概況表

名稱	丹娜絲 (DANAS)
編號	202504
生成地點	117.6, 19.9
侵(近)臺日期	2025 年 07 月 06 日
發布時間	海上 2025-07-05 08:30:00 陸上 2025-07-05 20:30:00
解除時間	陸上 2025-07-07 11:30:00 海上 2025-07-07 17:30:00
發布報數	20
最大強度	中度
近中心最大風速	40 (公尺/秒)
侵臺路徑分類	9
登陸地段	嘉義縣布袋鎮
動態	7 月 5 日 2 時於臺灣西南西方海面生成後向北北東移動，朝臺灣海峽南部接近，8 時 30 分發布海上颱風警報；同日晚間持續接近臺灣西南部陸地，20 時 30 分發布陸上颱風警報。6 日 23 時 40 分颱風中心登陸嘉義布袋。7 日 6 時於桃園新竹交界出海；同日 11 時 30 分颱風持續往北北東移動北部陸地脫離暴風範圍，解除陸上颱風警報，17 時 30 分臺灣北部海域脫離暴風圈，解除海上颱風警報。

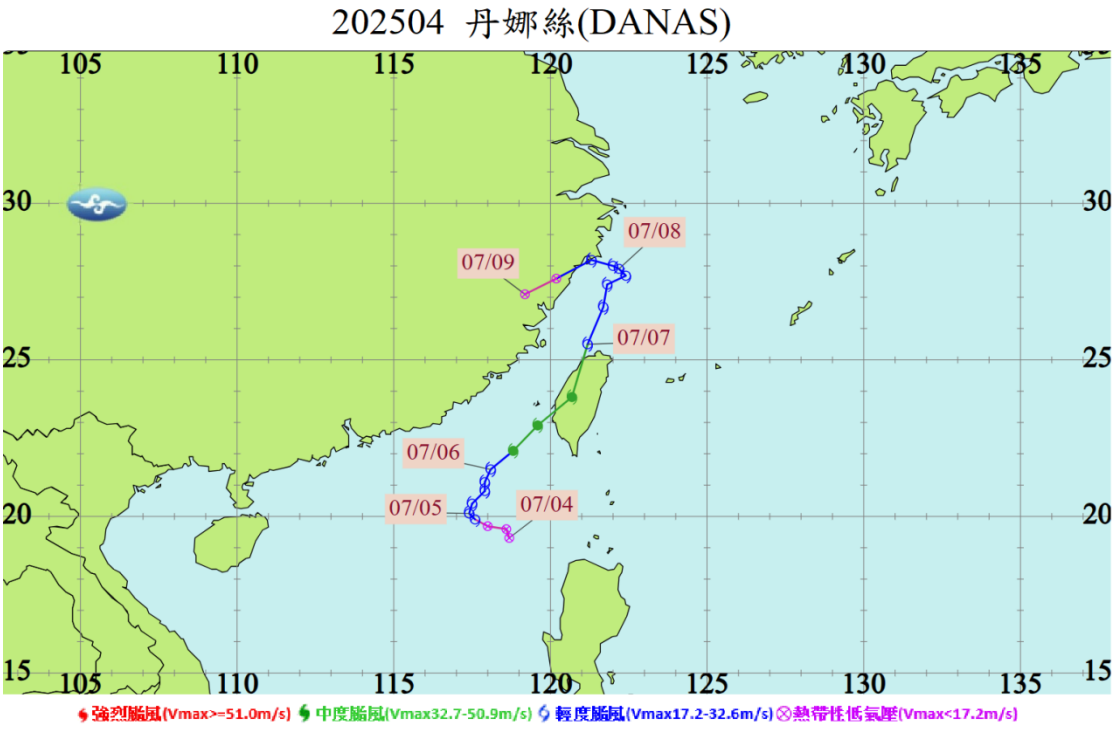

圖 1-1 丹娜絲颱風路徑圖

表 1-3 114 年丹娜絲颱風農村水保署土石流警戒發布紀錄

臺中市	和平區平等里 (發布黃色)2024/10/31 09:30 (提升紅色)2024/10/31 18:30 (調降黃色)2024/11/01 12:30 (解除黃色)2024/11/01 15:30	和平區梨山里 (發布黃色)2024/10/31 15:30 (解除黃色)2024/11/01 12:30	
南投縣	水里鄉車埕村 (發布黃色)2025/07/09 18:30 (解除黃色)2025/07/10 18:30	國姓鄉南港村 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (解除黃色)2025/07/10 18:30	竹山鎮中央里 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (解除黃色)2025/07/10 15:30
	竹山鎮延平里 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (解除黃色)2025/07/10 15:30	竹山鎮秀林里 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (解除黃色)2025/07/10 15:30	鹿谷鄉初鄉村 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (解除黃色)2025/07/10 18:30
	鹿谷鄉永隆村 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (解除黃色)2025/07/10 18:30	水里鄉新興村 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (解除黃色)2025/07/10 18:30	水里鄉新城村 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (解除黃色)2025/07/10 18:30
	水里鄉玉峰村 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (解除黃色)2025/07/10 18:30	水里鄉興隆村 (發布黃色)2025/07/09 18:30 (解除黃色)2025/07/10 15:30	水里鄉新山村 (發布黃色)2025/07/09 18:30 (解除黃色)2025/07/10 15:30
	水里鄉鉅工村	水里鄉水里村	鹿谷鄉瑞田村

	(發布黃色)2025/07/09 15:30 (解除黃色)2025/07/10 18:30	(發布黃色)2025/07/09 15:30 (解除黃色)2025/07/10 18:30	(發布黃色)2025/07/09 15:30 (解除黃色)2025/07/10 18:30
	竹山鎮桶頭里 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (解除黃色)2025/07/10 15:30		
臺東縣	金峰鄉新興村 (發布黃色)2025/07/06 06:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30	金峰鄉嘉蘭村 (發布黃色)2025/07/06 06:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30	金峰鄉歷坵村 (發布黃色)2025/07/06 06:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30
	金峰鄉賓茂村 (發布黃色)2025/07/06 06:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30	金峰鄉正興村 (發布黃色)2025/07/06 06:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30	達仁鄉台板村 (發布黃色)2025/07/06 06:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30
	達仁鄉土板村 (發布黃色)2025/07/06 06:30 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (解除黃色)2025/07/11 06:30	達仁鄉南田村 (發布黃色)2025/07/06 06:30 (發布黃色)2025/07/10 06:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	達仁鄉安朔村 (發布黃色)2025/07/06 06:30 (發布黃色)2025/07/10 06:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30
	大武鄉大竹村 (發布黃色)2025/07/06 06:30 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (提升紅色)2025/07/10 15:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	大武鄉大武村 (發布黃色)2025/07/06 06:30 (發布黃色)2025/07/10 06:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	大武鄉大鳥村 (發布黃色)2025/07/06 06:30 (發布黃色)2025/07/10 06:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30
	大武鄉尚武村 (發布黃色)2025/07/06 06:30 (發布黃色)2025/07/10 06:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	大武鄉南興村 (發布黃色)2025/07/06 06:30 (發布黃色)2025/07/10 06:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	太麻里鄉北里村 (發布黃色)2025/07/06 06:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30
	太麻里鄉大王村 (發布黃色)2025/07/06 06:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30	太麻里鄉金崙村 (發布黃色)2025/07/06 06:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30	太麻里鄉多良村 (發布黃色)2025/07/06 06:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30
	太麻里鄉香蘭村 (發布黃色)2025/07/06 06:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30	太麻里鄉華源村 (發布黃色)2025/07/06 06:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30	
臺南	白河區仙草里 (發布黃色)2025/07/10 12:30	白河區關嶺里 (發布黃色)2025/07/10 12:30	東山區高原里 (發布黃色)2025/07/10 12:30

市	(解除黃色)2025/07/11 06:30	(解除黃色)2025/07/11 06:30	(解除黃色)2025/07/11 06:30
	東山區南勢里 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (解除黃色)2025/07/11 06:30	東山區青山里 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (解除黃色)2025/07/11 06:30	楠西區龜丹里 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30
	楠西區灣丘里 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	南化區玉山里 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	
屏東縣	霧臺鄉霧臺村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/09 18:30 (提升紅色)2025/07/10 06:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	霧臺鄉阿禮村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/09 18:30 (提升紅色)2025/07/10 06:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	三地門鄉青葉村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (提升紅色)2025/07/10 15:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30
	三地門鄉青山村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (提升紅色)2025/07/10 15:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	三地門鄉安坡村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (提升紅色)2025/07/10 15:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	三地門鄉口社村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/10 06:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30
	三地門鄉達來村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/09 18:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	瑪家鄉北葉村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (提升紅色)2025/07/10 18:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	瑪家鄉佳義村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (提升紅色)2025/07/10 15:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30
	瑪家鄉瑪家村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/10 06:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	來義鄉來義村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/09 18:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	來義鄉義林村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/09 18:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (發布黃色)2025/07/10 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30
	來義鄉古樓村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	來義鄉丹林村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/09 18:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	來義鄉文樂村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30

	來義鄉望嘉村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	獅子鄉南世村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30	獅子鄉內獅村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30
	獅子鄉獅子村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30	獅子鄉丹路村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30	獅子鄉竹坑村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30
	獅子鄉內文村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (提升紅色)2025/07/06 15:30 (調降黃色)2025/07/07 12:30 (發布黃色)2025/07/10 06:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	獅子鄉草埔村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (提升紅色)2025/07/06 15:30 (調降黃色)2025/07/07 12:30 (發布黃色)2025/07/10 06:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	牡丹鄉牡丹村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30
	牡丹鄉石門村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30	牡丹鄉四林村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30	滿州鄉港口村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30
	瑪家鄉涼山村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (提升紅色)2025/07/10 18:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	泰武鄉泰武村 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (提升紅色)2025/07/10 15:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	滿州鄉滿州村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30
	來義鄉南和村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (解除黃色)2025/07/11 06:30		
高雄市	那瑪夏區達卡努瓦里 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (提升紅色)2025/07/09 18:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	那瑪夏區瑪雅里 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (提升紅色)2025/07/09 18:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	那瑪夏區南沙魯里 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (提升紅色)2025/07/09 18:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30
	甲仙區小林里 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (解除黃色)2025/07/11 06:30	甲仙區關山里 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (解除黃色)2025/07/11 06:30	甲仙區和安里 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30
	甲仙區大田里	甲仙區東安里	杉林區木梓里

	(發布黃色)2025/07/10 12:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	(發布黃色)2025/07/10 12:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	(發布黃色)2025/07/10 12:30 (提升紅色)2025/07/10 15:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30
	杉林區集來里 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (提升紅色)2025/07/10 15:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	美濃區獅山里 (發布黃色)2025/07/10 15:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	桃源區建山里 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 12:30 (提升紅色)2025/07/09 18:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30
	六龜區寶來里 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 12:30 (提升紅色)2025/07/09 18:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	六龜區文武里 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 12:30 (提升紅色)2025/07/09 18:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (發布黃色)2025/07/09 10:30 (提升紅色)2025/07/09 12:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	六龜區大津里 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 12:30 (提升紅色)2025/07/09 18:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30
	六龜區中興里 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 12:30 (提升紅色)2025/07/09 18:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	六龜區興龍里 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 12:30 (提升紅色)2025/07/09 18:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	六龜區新發里 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 12:30 (提升紅色)2025/07/09 18:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30
	茂林區多納里 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (解除黃色)2025/07/11 06:30	茂林區茂林里 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/10 06:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	桃源區梅山里 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 18:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30
	桃源區復興里 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 18:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	桃源區桃源里 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (提升紅色)2025/07/09 18:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	桃源區勤和里 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (提升紅色)2025/07/09 18:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30
	甲仙區西安里 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	茂林區萬山里 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (提升紅色)2025/07/10 15:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30	桃源區拉芙蘭里 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 18:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30

		(解除黃色)2025/07/11 12:30	(解除黃色)2025/07/11 12:30
	桃源區高中里 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 12:30 (提升紅色)2025/07/09 18:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	六龜區荖濃里 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 12:30 (提升紅色)2025/07/09 18:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	六龜區六龜里 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 12:30 (提升紅色)2025/07/09 18:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30
雲林縣	古坑鄉華山村 (發布黃色)2025/07/09 12:30 (解除黃色)2025/07/10 18:30	古坑鄉桂林村 (發布黃色)2025/07/09 12:30 (解除黃色)2025/07/10 18:30	古坑鄉草嶺村 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (解除黃色)2025/07/10 18:30
嘉義縣	梅山鄉龍眼村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30	梅山鄉圳南村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 12:30 (解除黃色)2025/07/11 06:30	梅山鄉瑞里村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 12:30 (解除黃色)2025/07/11 06:30
	梅山鄉安靖村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 12:30 (解除黃色)2025/07/11 06:30	梅山鄉太和村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/10 06:30 (解除黃色)2025/07/11 06:30	竹崎鄉文峰村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30
	竹崎鄉緞繻村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30	竹崎鄉桃源村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30	竹崎鄉塘興村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30
	竹崎鄉光華村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (解除黃色)2025/07/11 06:30	番路鄉大湖村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30	番路鄉下坑村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30
	番路鄉觸口村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30	番路鄉公興村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30	番路鄉公田村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30
	中埔鄉東興村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (解除黃色)2025/07/11 06:30	中埔鄉石弄村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (解除黃色)2025/07/11 06:30	大埔鄉永樂村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30
	阿里山鄉豐山村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 18:30	阿里山鄉來吉村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 15:30	阿里山鄉樂野村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 18:30

	(解除黃色)2025/07/11 06:30	(提升紅色)2025/07/09 18:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	(解除黃色)2025/07/11 06:30
	阿里山鄉達邦村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (提升紅色)2025/07/10 15:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	阿里山鄉里佳村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	中埔鄉中崙村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/10 00:30 (解除黃色)2025/07/11 06:30
	中埔鄉瑞豐村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/10 12:30 (解除黃色)2025/07/11 06:30	大埔鄉茄苳村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	大埔鄉大埔村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30
	阿里山鄉山美村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	梅山鄉瑞峰村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/10 06:30 (解除黃色)2025/07/11 06:30	阿里山鄉茶山村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (提升紅色)2025/07/09 18:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30
	竹崎鄉中和村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (解除黃色)2025/07/11 06:30	大埔鄉和平村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (提升紅色)2025/07/10 12:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30	阿里山鄉新美村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (提升紅色)2025/07/09 18:30 (調降黃色)2025/07/11 06:30 (解除黃色)2025/07/11 12:30
	阿里山鄉十字村 (發布黃色)2025/07/06 12:30 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (解除黃色)2025/07/11 06:30	竹崎鄉復金村 (發布黃色)2025/07/06 15:30 (解除黃色)2025/07/07 12:30	
彰化縣	二水鄉大園村 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (解除黃色)2025/07/10 15:30	二水鄉源泉村 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (解除黃色)2025/07/10 15:30	二水鄉倡和村 (發布黃色)2025/07/09 15:30 (解除黃色)2025/07/10 15:

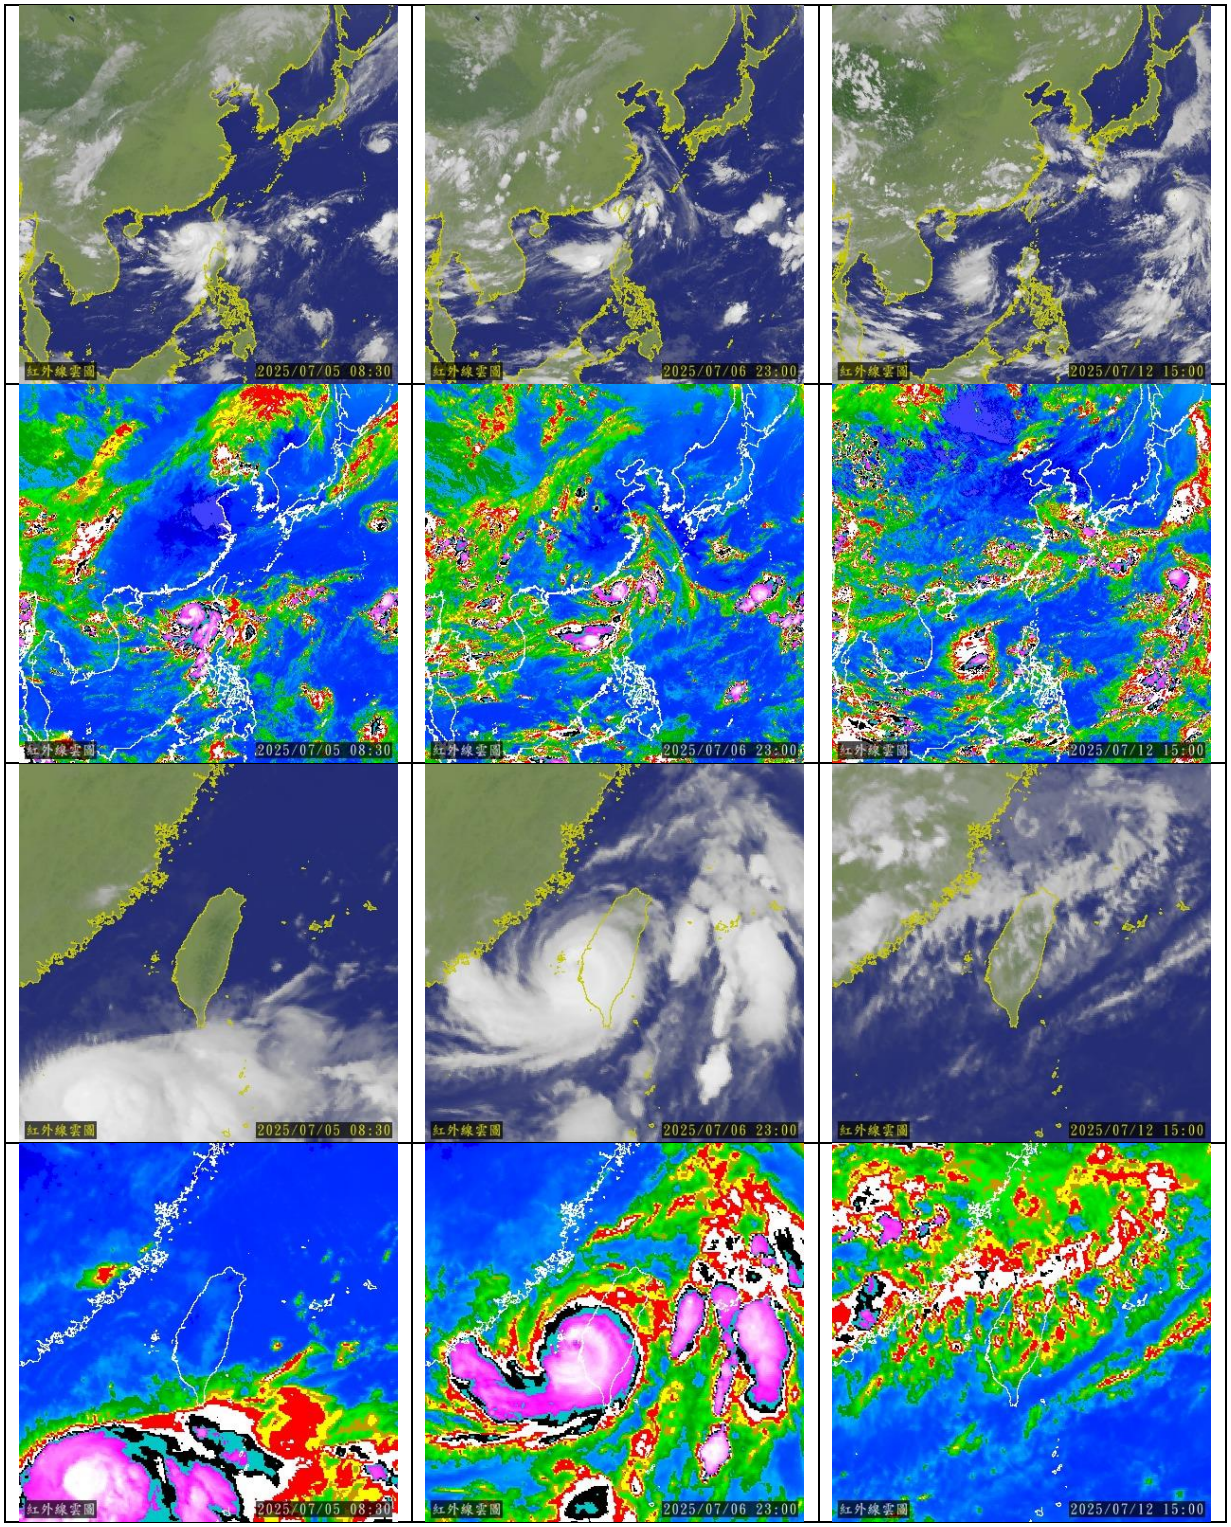

資料來源：彙整自土石流及大規模崩塌防災應變系統。

圖 1-2 114 年丹娜絲颱風衛星雲圖

農業部農村發展及水土保持署

丹娜絲颱風土砂災害狀況

南投信義鄉明德村
投縣DF185

苗栗泰安鄉梅園村
大鹿林道東線5.2K、9K、14.9K

雲林古坑鄉草嶺村
草嶺潭舊址

媒體報導災情

共48件

新增崩塌判釋

30處(51.74ha)

完成29%警戒區判釋

縣市	災情件數	縣市	災情件數
臺東縣	12	嘉義縣	3
苗栗縣	8	雲林縣	3
屏東縣	6	新竹縣	1
南投縣	5	新竹市	1
臺中市	4	彰化縣	1
高雄市	4		

- **受災期間：2025/7/6~7/13**
- **重大災例現勘3處**
  - ✓無人傷亡
  - ✓無房屋受損

截至2025/7/15 16:00止

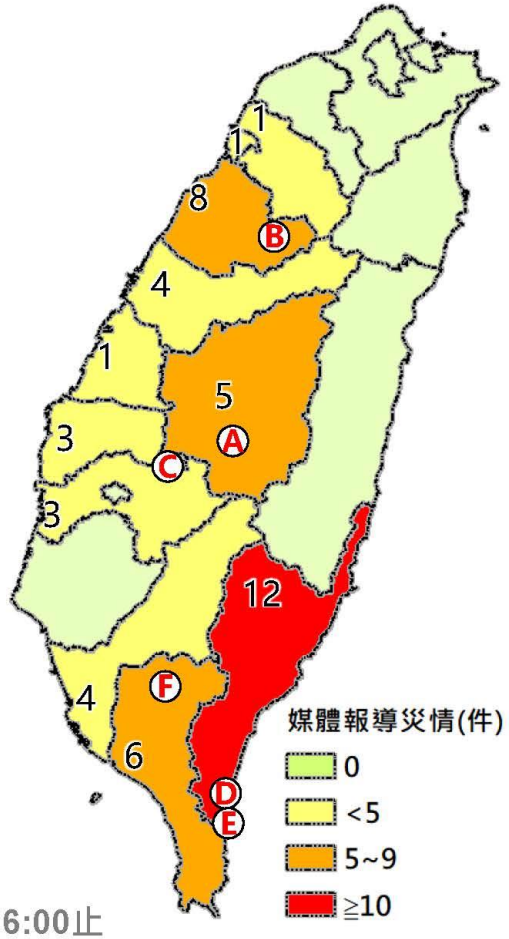

臺東大武鄉大鳥村
台9線417公里

臺東大武鄉尚武村
台9線421k處(朝庸橋)

屏東高樹鄉新豐村
大津瀑布下游(屏縣DF004)

優質・效率・團隊 0

編號	影像性質	行政區	地標/災害類型	坐標(TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140706-01	媒體報導	嘉義縣阿里山鄉樂野村	台18線阿里山公路72公里處；崩塌	221789, 2595360	2025/7/6	無人員傷亡	嘉義縣政府、自由時報	114年07月06日台18線阿里山公路72公里處今天清晨1時02分發生落石，大小石塊占據路面，只能單線雙向通車，經阿里山工務段派遣機具前往處理，於清晨1時47分清除完畢，恢復雙向通行。		公路局	
1140706-02	媒體報導	屏東縣滿州鄉里德村	滿州鄉里德村山頂路38號；洪水	235284, 2436218	2025/7/6	無人員傷亡	恆春警方、ETtoday新聞雲	114年07月06日，恆春警分局及消防人員於今(6)日上午7時52分接獲滿州鄉山頂路38號山洪爆發消息，立即派員處理，發現泥流從報案人住處旁山坡滾滾而下，堆積在路面，影響往來用路人安全。		屏東縣政府	
1140706-03	媒體報導	臺東縣蘭嶼鄉紅頭村	漁人部落到藍恩路；洪水	305645, 2436464	2025/7/6	無人員傷亡	台視新聞網	114年07月6日台東縣蘭嶼受到颱風丹娜絲外圍環流影響，蘭嶼地區環島公路出現土石流，滾滾泥流淹沒道路，導致車輛無法通行從漁人部落到藍恩路一帶遭土石流侵襲，交通中斷。		台東縣政府	

編號	影像性質	行政區	地標/災害類型	坐標(TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140706-04	媒體報導	臺東縣大武鄉南興村	台9線425公里處；洪水	238597, 2467227	2025/7/6	無人員傷亡	TVBS新聞網	114年7月6日下午3時左右，臺東縣臺9線425k處大武鄉南興村，因受連續降雨影響，導致土砂溢淹至公路。		公路局	

編號	影像性質	行政區	地標/災害類型	坐標(TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140707-01	媒體報導	臺東縣海端鄉霧鹿村	台東縣海端鄉台20線178公里處（六口溫泉明隧道前）；崩塌	252722, 2563975	2025/7/6	無人員傷亡	自由時報	114年07月06日中颱丹娜絲來襲，今傍晚5時許，台東縣海端鄉台20線178公里處（六口溫泉明隧道前）發生邊坡落石，導致4部下山採購物資返回利稻的村民車輛受困於隧道內。		公路局	
1140707-02	媒體報導	臺東縣太麻里鄉多良村	台9線405公里又700公尺大溪路段；洪水	244267, 2484727	2025/7/6	無人員傷亡	聯合新聞網	114年07月06日下午5時，台9線405 公里又700公尺大溪路段發生土石泥流，泥流占用南下車道，公路局人員開放北上單線雙向通行。工務段指出，廠商已進場搶修。		公路局	
1140707-03	媒體報導	臺東縣大武鄉大竹村	台東台9線409公里處；崩塌	243358, 2481483	2025/7/6	無人員傷亡	TVBS新聞網	114年07月06日台東台9線409公里處下午3點多發生土石崩落事件，大量泥流夾帶泥沙沖刷到路面，導致道路中斷，多輛車輛無法通行。		公路局	

編號	影像性質	行政區	地標/災害類型	坐標(TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140707-04	媒體報導	南投縣仁愛鄉發祥村	投89線15.8、37.6、30.7K；崩塌	269477, 2670469	2025/7/7	無人員傷亡	中央通訊社	114年07月07日仁愛鄉「投89線」力行產業道路指標15.8公里處雖出現泥流仍可通過；指標37.6公里處落石，廠商上午完成清除；指標30.7公里處邊坡嚴重坍方，近期反覆中斷，今天又出現土石滑落、坍方。		南投縣政府	
1140707-05	媒體報導	高雄市桃源區勤和里	勤和復興河床便道；洪水	227996, 2565172	2025/7/7	無人員傷亡	壹蘋新聞網	114年07月07日受丹娜絲颱風影響，因荖濃溪河水瀑漲夾帶土石沖擊，勤和~復興河床涵管便道於今(7)日上午5時30分遭沖毀約100公尺，所幸公路局5日晚上10時實施道路預警性封閉，無人、車傷亡。		公路局	
1140707-06	媒體報導	屏東縣滿州鄉港口村	屏東縣滿州鄉港口村港口溪旁橋頭路、公館路道路周邊及農田淹水；洪水	231318, 2433745	2025/7/6	無人員傷亡	台視新聞網	114年07月06日屏東縣滿州鄉港口村港口溪旁橋頭路、公館路道路周邊及農田淹水，影響往來用路人安全，港口溪屬縣管河川。		屏東縣政府	

編號	影像性質	行政區	地標/災害類型	坐標(TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140708-01	媒體報導	臺東縣大武鄉大鳥村	台9線417公里；崩塌	240752, 2474652	2025/7/8	無人員傷亡	TVBS新聞網	114年7月8日上午，颱風丹娜絲剛過境，台東縣大武鄉台9線417公里處邊坡突然坍方，不斷有石塊掉落，當時一輛小客車行經不慎撞上，所幸駕駛沒有受傷。		公路局	
1140708-02	媒體報導	臺中市和平區達觀里	和平達觀里天嶺巷路段；崩塌	243586, 2690328	2025/7/7	無人員傷亡	原視新聞網	114年7月6日，和平達觀里天嶺巷路段因為大雨的關係，造成了農路坍方，廠商機具已於7日搶修完畢。		臺中市政府	
1140708-03	媒體報導	高雄市大樹區姑山里	高雄市大樹區和山光電案場；崩塌	189987, 2512833	2025/7/7	無人員傷亡	東森新聞	114年7月6日，和山光電案場因大雨沖刷，造成基地內2處邊坡崩落，市府已立即要求業者以怪手機具進行修坡；施工中永久性排水溝，遭受土砂掩蓋、部分溝段下遭掏空，已請業者研議加強溝底基礎強度並盡速完成施工。		高雄市政府	

編號	影像性質	行政區	地標/災害類型	坐標(TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140709-01	媒體報導	雲林縣林內鄉林北村	台三線雲林往竹山路段；崩塌	213350, 2629898	2025/7/8	無人員傷亡	TVBS新聞網	114年7月8日台三線雲林往竹山的南雲大橋路段出現多處小規模土石流，南投竹山、雲林西螺、莿桐、斗六等地區則傳出淹水情況。		公路局	
1140709-02	媒體報導	雲林縣林內鄉林北村	彰化二水=林內間（K255+200）；崩塌	211278, 2628928	2025/7/8	無人員傷亡	壹蘋新聞網	114年07月08日台鐵表示，今（8日）14：25於彰化二水=林內間（K255+200）因受豪大雨影響，造成路線掏空造成雙線不通。目前相關應變措施已於14：30成立本部一級應變小組及中、南區應變分組。		台鐵局	
1140709-03	媒體報導	雲林縣古坑鄉草嶺村	草嶺潭舊址再次形成堰塞湖；崩塌	216647, 2608102	2025/7/8	無人員傷亡	農村水保署、經濟部水利署第四河川分署通報	114年07月08日，本署南投分署於19時接獲水利署四河分署通報，雲林縣古坑鄉草嶺村草嶺潭舊址再次形成堰塞湖，經查本案地點非土石流或大規模崩塌範圍。		經濟部水利署、雲林縣政府	

編號	影像性質	行政區	地標/災害類型	坐標(TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140709-04	媒體報導	臺東縣蘭嶼鄉椰油村	蘭嶼紅頭岩一帶、蘭嶼燈塔附近；崩塌	301660, 2442618	2025/7/9	無人員傷亡	自由時報	114年07月09日民眾凌晨環島卻見到巨石擋路，讓許多鄉民感到吃驚與擔心，王先生在經過紅頭岩一帶、蘭嶼燈塔附近的道路時，見到一顆近2公尺高大石擋在路中，他在臉書社團發文，好意提醒眾人注意，網友也提醒他快速離開，以免再遇落石。		台東縣政府	

編號	影像性質	行政區	地標/災害類型	坐標(TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140709-05	媒體報導	苗栗縣泰安鄉清安村	苗栗縣泰安鄉苗62縣約5公里處；崩塌	241174, 2705357	2025/7/9	無人員傷亡	TVBS新聞網	114年7月9日苗栗縣泰安鄉苗62縣約5公里處，發生落石坍方的意外，目前該處雙向封閉，已由泰安鄉公所通知廠商，待雨勢小後進場處理，現場也有擺放交通錐警示。		苗栗縣政府	
1140709-06	媒體報導	苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村	苗栗縣苗119線19公里處；崩塌	229574, 2707874	2025/7/9	無人員傷亡	中時新聞網	114年07月09日苗栗縣苗119線19公里處銅鑼鄉往客屬大橋方向路段，9日上午9時50分許發生山壁土石崩落，苗栗警分局員警據報到場警戒。		苗栗縣政府	

編號	影像性質	行政區	地標/災害類型	坐標(TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140709-07	媒體報導	彰化縣二水鄉倡和村	彰化縣二水鄉員集路接近靈山寺路段；崩塌	216737, 2634741	2025/7/9	無人員傷亡	周刊王CTWANT	114年07月09日彰化縣二水鄉員集路接近靈山寺路段，下午2時許發生一起驚險意外，由於連日暴雨導致山區土石鬆動，當地員集路部分路段早已拉起封鎖線，禁止車輛通行，確保安全，然而，仍有一輛自小客車及一輛機車無視封鎖警示，強行穿越危險路段，結果被突如其來的泥石流沖刷，雙雙受困於泥流中，情況相當危急。		彰化縣政府	
1140709-08	媒體報導	南投縣水里鄉新山村	台21線約79公里處；崩塌	236387, 2630122	2025/7/9	無人員傷亡	自由時報	114年07月09日南投省道台21線約79公里處新中橫公路，位在水里鄉往信義鄉路段，下午1點多因山區大雨狂炸，導致邊坡崩落土石，其中1顆有如汽車大小的巨石佔據道路影響通行，所幸未有人車損傷，公路局信義工務段已調派機具搶修，以免交通受阻。		公路局	

編號	影像性質	行政區	地標/災害類型	坐標(TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140709-09	媒體報導	嘉義縣梅山鄉太興村	嘉154線3公里處；崩塌	211247, 2605488	2025/7/9	無人員傷亡	自由時報	114年07月09日嘉縣山區7日受丹娜絲颱風重創，今持續下大雨，梅山鄉又傳出零星災情，太平村往太興村的嘉154線3公里處，因連日大雨，路基崩塌，梅山鄉公所已暫時封閉該段道路，委託廠商自上邊坡開闢便道，讓當地居民方便通行。		嘉義縣政府	
1140709-10	媒體報導	臺中市和平區達觀里	中47鄉道17.5K處發生落石坍方；崩塌	242154, 2690034	2025/7/9	無人員傷亡	防災專員蕭美麟	114年07月09日輿情報載臺中市和平區太達觀里防災專員於7月9日下午回報中47鄉道17.5K處發生落石坍方消息，導致雙向道路封閉，本次災害無人員傷亡。		台中市政府、和平區公所	

編號	影像性質	行政區	地標/災害類型	坐標(TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140710-01	媒體報導	臺中市新社區中和里	中和里中95-1道路、知名景點「安妮公主花園」前路段；崩塌	232564, 2673573	2025/7/9	無人員傷亡	自由時報	114年07月09日（9日）傍晚約5時35分，在中和里中95-1道路、知名景點「安妮公主花園」前路段，因路基掏空導致護欄滑落，頓時陷入交通中斷。		台中市政府	
1140710-02	媒體報導	南投縣信義鄉人和村	南投縣信義鄉保甲林野溪(DF185)；崩塌	236006, 2623538	2025/7/9	無人員傷亡	南投分署防災專員群組傅永芳專員通報	114年07月09日南投縣信義鄉傅永芳專員下午4時07分通報因午後南投縣信義鄉山區降下大雨，信義鄉保甲林野溪(DF185)發生土石崩落，土石堆積影響道路通行，影響往來用路人安全。		南投縣政府、南投縣信義鄉公所、農村水保署南投分署。	
1140710-03	媒體報導	嘉義縣阿里山鄉樂野村	169縣道28K處；崩塌	221118, 2594172	2025/7/9	無人員傷亡	Yahoo奇摩（即時新聞）	114年07月09日嘉義縣阿里山鄉達邦公路（169縣道）石棹至達邦路段，在28K處施作明隧道工程區域，今天（9日）下午發生巨大落石阻斷道路無法通行，縣府籲部落居民及用路人暫時改道行駛。		嘉義縣政府	

編號	影像性質	行政區	地標/災害類型	坐標(TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140710-04	媒體報導	臺東縣大武鄉尚武村	臺9線421k處；洪水	239020, 2471333	2025/7/10	無人員傷亡	三立新聞網	114年7月10日上午3時左右，臺東縣臺9線421k處大武鄉尚武村朝庸溪，因受連續降雨影響，導致溪水及樹枝、雜物溢淹至公路。		臺東縣政府、大武鄉公所、交通部公路局南區養護工程分局大武工務段	
1140710-05	媒體報導	屏東縣霧臺鄉大武村	屏東縣霧台鄉霧大二號橋便道涵管沖垮；洪水	224624, 2517157	2025/7/9	無人員傷亡	民視新聞網	114年07月09日屏東縣霧臺鄉於7月9日晚間山區大雨不斷。霧臺鄉大武部落，唯一的聯外道路"霧大二號橋"，不敵豪雨沖刷，既有便道涵管基座被沖垮。		屏東縣政府、霧臺鄉公所	

編號	影像性質	行政區	地標/災害類型	坐標(TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140710-06	媒體報導	臺東縣蘭嶼鄉紅頭村	東80線瑪莎堡路段；洪水	304620, 2437359	2025/7/10	無人員傷亡	ETtoday新聞雲	114年07月10日上午，蘭嶼鄉椰油往漁人方向、位於瑪莎堡路段，發生約60公分高的土石流，造成雙向車道中斷，現場車輛嚴重回堵。		台東縣政府	
1140710-07	媒體報導	臺中市太平區東汴里	台中太平赤崁觀景台；崩塌	231514, 2664551	2025/7/9	無人員傷亡	三立新聞網	114年07月09日，太平赤崁頂觀景平台出現位移狀況，路面接縫處出現15公尺長、5公分寬裂縫，下方路基疑似被掏空，目前已通知市府到場處理，也提醒民眾多加留意。		臺中市政府	
1140710-08	媒體報導	屏東縣霧臺鄉阿禮村	台24線臨時便道；崩塌	225047, 2514366	2025/7/10	無人員傷亡	東森新聞	114年07月10日，連日大雨造成台24線臨時便道路面掏空，另一處便道通往阿禮村更出現阿禮大崩壁，不僅土石坍方崩落，雨水夾帶泥土落石傾洩而下。		公路局	

編號	影像性質	行政區	地標/災害類型	坐標(TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140710-09	媒體報導	苗栗縣公館鄉福德村	公館鄉台6線開礦村路段；崩塌	235590, 2706636	2025/7/9	無人員傷亡	警政時報	114年07月09日9時45分許，苗栗公館鄉台6線開礦村路段，發生山壁土石崩落情形，落石散布車道，苗栗警察分局獲報後立即至現場擺置交通錐，並通知道路主管機關公路局苗栗工務段派工至現場清除，請用路人行經注意。		公路局	
1140710-10	媒體報導	臺東縣大武鄉南興村	台9線南興路段425公里；洪水	238596, 2467235	2025/7/10	無人員傷亡	台視新聞	114年07月10日，南迴公路台9線南興路段425公里處，有野溪溢出路面，滾滾泥水淹過南下車道，公路局派人前往進行交通管制，調撥北上內側車道給南下車輛通行。		公路局	
1140710-11	媒體報導	臺東縣達仁鄉森永村	台9戊線2.9K；崩塌	236466, 2464558	2025/7/10	無人員傷亡	工商時報	114年07月10日早上7點多，台九戊線(舊南迴公路)2.9公里處南下路段，因道路地基掏空造成局部塌陷，目前警方已在該處路段拉起封鎖線管制。		公路局	

編號	影像性質	行政區	地標/災害類型	坐標(TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140710-12	媒體報導	高雄市桃源區勤和里	明霸克露橋；崩塌	228200, 2565135	2025/7/10	無人員傷亡	台視新聞	114年07月09日，高雄桃源區也出現強烈雨勢，明霸克露橋道路封閉，一旁山坡不斷有土石落下。		公路局	
1140710-13	媒體報導	苗栗縣泰安鄉中興村	司馬限林道5.45K；崩塌	246587, 2700187	2025/7/10	無人員傷亡	自由時報	114年07月10日上午，雪霸國家公園雪見遊憩區的司馬限林道5.45K處出現坍方，車輛無法通行，雪霸國家公園管理處請遊客改道梅興聯絡道或卓蘭進入。		雪霸國家公園管理處	

編號	影像性質	行政區	地標/災害類型	坐標(TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140710-14	媒體報導	高雄市桃源區寶山里	高雄桃源區寶山藤枝林道10k；崩塌	219715, 2547984	2025/7/10	無人員傷亡	中時新聞網	114年07月10日豪大雨影響，10日下午高雄桃源區寶山藤枝林道10k處有土石滑落。		林業署	

編號	影像性質	行政區	地標/災害類型	坐標(TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140711-01	媒體報導	新竹市香山區香村里	香山區元培街323巷1；崩塌	243899, 2741345	2025/7/10	無人員傷亡	台灣好新聞	114年07月10日新竹市連日降下豪雨，導致香山區元培街323巷上午發生房屋土製泥牆倒塌情形，不僅造成民宅主要出入口被土石掩埋、通行受阻，建物內部牆面亦出現明顯裂縫，恐有結構安全疑慮。		新竹市政府	
1140711-02	媒體報導	屏東縣來義鄉望嘉村	望嘉教會旁民宅；崩塌	210825, 2484956	2025/7/9	無人員傷亡	自由時報	114年07月09日來義望嘉教會旁民宅高達約8公尺擋土牆昨天夜間崩塌，雨勢沒有和緩趨勢，望嘉村長江登木擔心會帶來二次傷害。		屏東縣政府	

編號	影像性質	行政區	地標/災害類型	坐標(TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140711-03	媒體報導	苗栗縣頭屋鄉明德村	苗栗縣頭屋鄉明德水庫南岸道路（苗16線）4.1公里處；崩塌	240115, 2720079	2025/7/11	無人員傷亡	自由時報	114年07月11日頭屋鄉明德村長獲報，明德水庫南岸道路（苗16線）4.1公里處道路坍塌，他前往了解，發現有範圍長約20公尺道路半邊坍塌，公所已派員設置拒馬、交通錐等警示，並啟動災後復建工程提報。		苗栗縣政府	
1140711-04	媒體報導	苗栗縣泰安鄉梅園村	大鹿林道東線5.2K、9K、14.9K；崩塌	264149, 2709876	2025/7/10	無人員傷亡	自由時報	114年07月10日丹娜絲颱風過後，苗栗地區連日降雨，致雪霸國家公園大鹿林道東線5.2K、9K、14.9K多處坍方落石及倒木及5.3K邊坡路基流失，已聯繫開口合約廠商今日進行搶修作業。		林業署	
1140711-05	媒體報導	苗栗縣泰安鄉錦水村	苗62線6.5K處；崩塌	241829, 2706677	2025/7/11	無人員傷亡	自由時報	114年07月11日泰安鄉苗62線6.5K處今（11）日上午發生落石坍方情形，幸好未造成人員傷亡，但落石阻擋通行，已由警方設警示封閉，待泰安鄉公所派員清除。		苗栗縣政府	

編號	影像性質	行政區	地標/災害類型	坐標(TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140711-06	媒體報導	新竹縣北埔鄉大湖村	新竹縣北埔鄉大湖村5鄰、12鄰；崩塌	258656, 2732620	2025/7/9	無人員傷亡	自由時報	114年07月09日新竹縣北埔鄉大湖村5鄰、12鄰傳出民宅旁駁坎和住家附近邊坡崩塌的災情，前者甚至讓緊鄰的何姓4戶住家地基面臨掏空，30多名老小居住不安。		新竹縣政府	

編號	影像性質	行政區	地標/災害類型	坐標(TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140712-01	媒體報導	苗栗縣三灣鄉大河村	臺3線104.5K；崩塌	245757, 2722404	2025/7/11	無人員傷亡	苗栗縣政府警察局、蕃薯藤	114年7月11日7時許，臺3線104.5K處路大量土石滑落土石散落於車道上。		公路局	
1140712-02	媒體報導	屏東縣高樹鄉新豐村	屏東高樹鄉的大津瀑布下游；洪水	213151, 2528890	2025/7/10	無人員傷亡	民視新聞網	114年07月10日屏東高樹鄉的大津瀑布下游，10日出現土石流的狀況，一度造成道路中斷，居民無法出入，自稱人在孤島，幸好鄉公所緊急調派工作人員前來疏濬，協助搶通道路。		屏東縣政府	
1140712-03	媒體報導	臺東縣鹿野鄉鹿野村	臺9線339.5公里處(鹿鳴段)；崩塌	260759, 2533110	2025/7/11	無人員傷亡	蕃薯藤	114年07月11日臺東縣鹿野鄉臺9線339.5公里處(鹿鳴段)，於11日7時5分許，發生落石影響交通情形，其中2顆為體積較大的岩塊，阻礙來車通行，對交通造成潛在危險。		公路局	

編號	影像性質	行政區	地標/災害類型	坐標(TWD97)	拍攝日期	災害統計	照片來源	影像說明	相關連結	權責單位	影像縮圖
1140712-04	媒體報導	南投縣水里鄉鉅工村	南投水里鄉二坪路；崩塌	235637, 2634529	2025/7/11	無人員傷亡	聯合新聞網	114年07月11日南投水里鄉二坪路發生嚴重土石坍方，兩百多人受困。立委游顥、南投縣議員陳淑惠、水里鄉長葉銘豐11日會同台電會勘，關注道路搶通進度及坍方區上方兩座電塔安全，盼盡速防止災情擴大。		南投縣政府	

第二章　現勘調查成果

有關 114 年丹娜絲颱風造成之重大土砂災害，共執行 2 處災例現勘(圖 2-1)，災損彙整如表 2-1 所示，各災例之基本資料如表 2-2 所示，詳細現勘資料詳附錄一及附錄二所示。

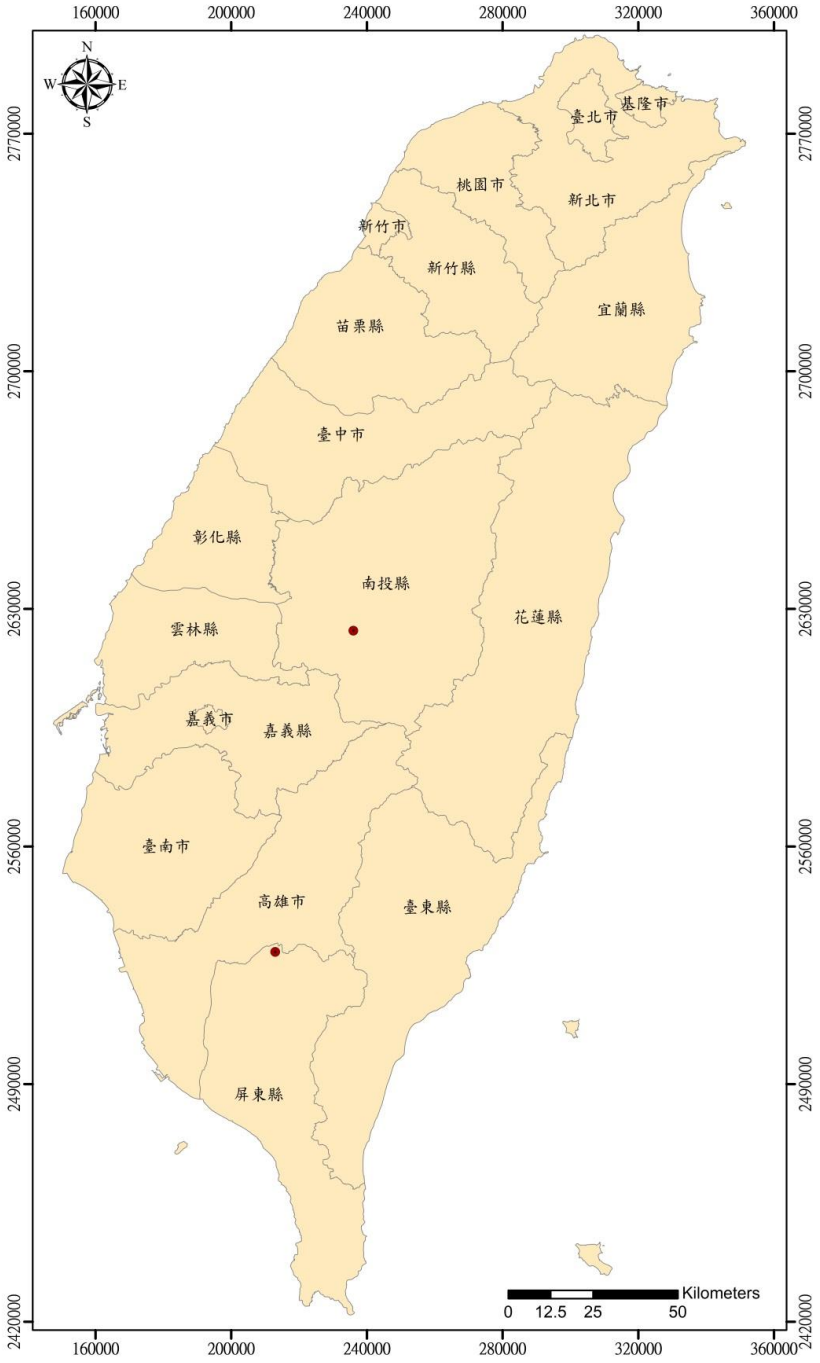

圖 2-1 114 年丹娜絲颱風重大土砂災害地點分布圖

表 2-1 114 年丹娜絲颱風重大土砂災情統計表

縣市	土石流(處)	崩塌(處)	洪水(處)	人命損失(人)			房屋受損(戶)	道路毀損(處)
				死亡	失蹤	受傷		
南投縣	1	0	0	0	0	0	0	1
屏東縣	0	0	1	0	0	0	0	1
總計	1	0	1	0	0	0	0	2

(以上災害類型統計數量，係以各處災害類型之主要類型為主)

表 2-2 114 年丹娜絲颱風重大土砂災例地點及災害類型

災例編號	縣市	鄉鎮區	村里	地標	災害類型
114 年丹娜絲颱風-南投信義-001	南投縣	信義鄉	明德村	投縣 DF185	土石流
114 年丹娜絲颱風-屏東高樹-001	屏東縣	高樹鄉	新豐村	屏縣 DF004	洪水

第三章　結論與建議

丹娜絲颱風於應變期間蒐集之新聞輿情共48件，並包含2件現勘災例，主要災因為颱風引進西南風帶來之連日降雨所致，因此主要災區位於臺東、屏東及高雄，而颱風於嘉義登陸北上，因此苗栗至嘉義一帶亦有不少災情傳出。在災害分類部分，主要為崩塌類型共37筆，另有11筆屬於洪水類型，皆因連日降雨導致野溪溪水暴漲所致。

丹娜絲颱風期間共執行「114 年丹娜絲颱風-南投信義-001」及「114年丹娜絲颱風-屏東高樹-001」等2處災例現勘，依據災例之資料分析，南投信義-001即位於投縣DF185，因丹娜絲颱風引進西南風造成之降雨引發土石流，源頭既有崩塌地無明顯擴大，推測土砂來源為裸露坡面之沖刷所致，雖災前流路已完成清疏工作，但本次災害土砂又再次阻塞過路箱涵、既有河道及產業道路旁之排水渠道，溢流後淤埋中平巷及產業道路，並堆積於凱米颱風之堆積區(即現況土方暫置區)之上。

屏東高樹-001則為屏縣DF004，因丹娜絲颱風引進西南風帶來之降雨造成溪水暴漲，由於屏縣DF004下游與圳路交匯處造成阻塞，洪水有溢流發生，並造成泰和路路面損毀，推估土砂來源為河道沖刷所致。

附錄一

114 年丹娜絲颱風重大土砂災例現勘最速報

114.07.13 版(初步資料尚未經委員審查，僅供參考)

114 年土砂災例最速報

丹娜絲颱風

南 投 縣—信義鄉明德村

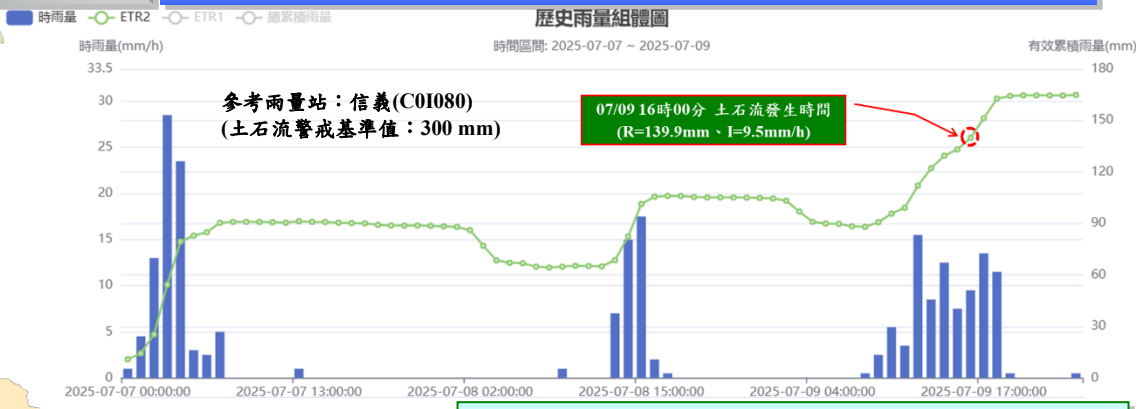

114 年丹娜絲颱風-南投信義-001

- ❖災害發生位置：投縣 DF185
- ❖災害發生時間：07 月 09 日 16 時 00 分
- ❖災害類型：土石流
- ❖災害發生之有效累積雨量：139.9mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
註 3：發生時間為推估時間。
註 4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

❖災損描述與統計：

✓災情描述：投縣 DF185 因丹娜絲颱風引進西南風造成之降雨引發土石流，源頭既有崩塌地無明顯擴大，推測土砂來源為裸露坡面之沖刷所致，雖災前流路已完成清疏工作，但本次災害土砂又再次阻塞過路箱涵、既有河道及產業道路旁之排水渠道，溢流後淤埋中平巷及產業道路，並堆積於凱米颱風之堆積區(即現況土方暫置區)之上。

✓災害規模：堆積範圍長約 120 公尺，最大寬度約 80 公尺，面積約 4,800 平方公尺，平均堆積深度約 0.8 公尺，堆積土方量約 3,840 立方公尺。

✓災損統計：道路淤埋長度約 120 公尺。

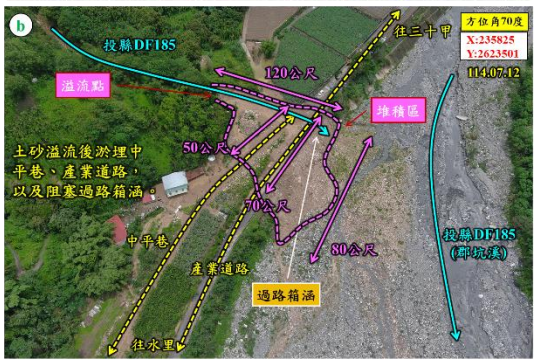

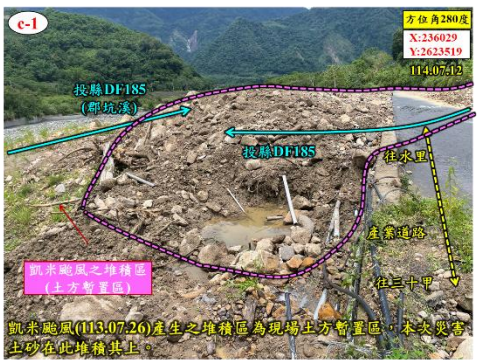

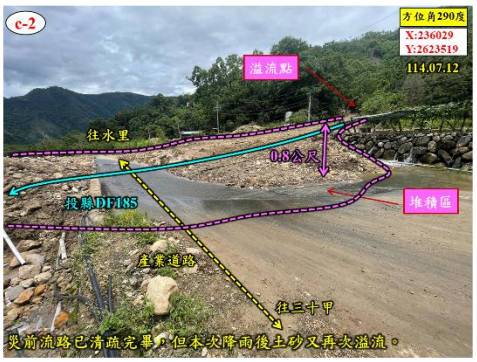

114 年土砂災例最速報

丹娜絲颱風

屏 東 縣—高樹鄉新豐村

114 年丹娜絲颱風-屏東高樹-001

- ❖災害發生位置：屏縣 DF004
- ❖災害發生時間：07 月 10 日 18 時
- ❖災害類型：洪水
- ❖災害發生之有效累積雨量：405.1mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
註 3：發生時間為推估時間。
註 4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

❖災損描述與統計：

✓災情描述：屏縣 DF004 因丹娜絲颱風引進西南風帶來之降雨造成溪水暴漲，由於屏縣 DF004 下游與圳路交匯處造成阻塞，洪水有溢流發生，並造成泰和路路面損毀，現況集水區僅凱米颱風造成之崩塌地，但已完成治理工程，而慈津寶宮旁之河段則於執行凱米颱風災後復建工程，因此推估土砂來源為河道沖刷所致。

✓災害規模：堆積範圍長約 80 公尺，平均寬度約 5 公尺，面積約 400 平方公尺，平均堆積深度約 2 公尺，堆積土方量約 800 立方公尺。
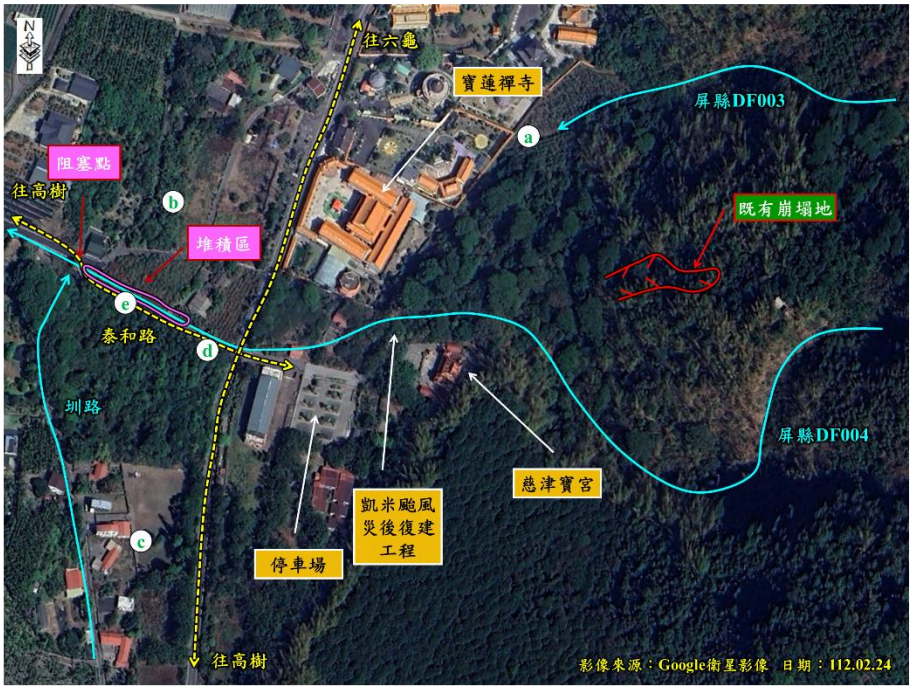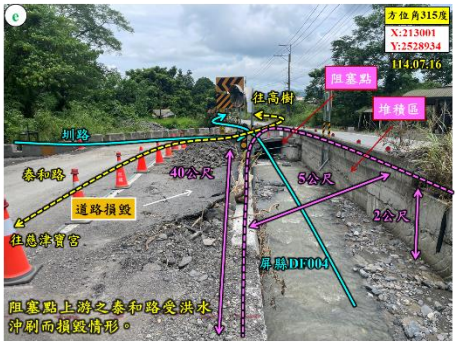
✓災損統計：道路損毀長度約 40 公尺。
